

5.2.1 มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง (โดยอุปกรณ์การตรวจวัดความเข้มแสงที่ได้มาตรฐาน) และดำเนินการแก้ไขตามที่มาตรฐานกำหนด

(1) มีการตรวจวัดความเข้มแสงประจำปีพร้อม แสดงหลักฐานผลการตรวจวัดแสงเฉพาะจุดทำงานและพื้นที่ทำงาน



แผ่นที่ 1

แบบรายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างภายในอาคาร
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนัก วิชาการ กลุ่มงาน ชั้น 2
วัน เดือน ปี ที่ตรวจวัด 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.50 น.

ลำดับ	ประเภทพื้นที่ตรวจวัด	จุดที่ตรวจ	ผลการตรวจวัด (ลักซ์)				ผลการประเมิน		หมายเหตุ
			ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ค่าเฉลี่ย	ตามเกณฑ์	ไม่เป็นไปตามเกณฑ์	
1.	ห้องสำนักงาน	โต๊ะทำงาน	578	574	569	573.67	✓		ผู้อำนวยการสำนักฯ
2.	ห้องสำนักงาน	โต๊ะทำงาน	319	317	319	318.33		✓	
3.	ห้องสำนักงาน	โต๊ะทำงาน	264	264	265	264.33		✓	
4.	ห้องสำนักงาน	โต๊ะทำงาน	394	401	411	402	✓		กลุ่มงานบริหารทั่วไป
5.	ห้องสำนักงาน	โต๊ะทำงาน	409	408	413	410	✓		
6.	ห้องสำนักงาน	โต๊ะทำงาน	379	377	376	377.33		✓	
7.	ห้องสำนักงาน	โต๊ะทำงาน	381	363	362	368.67		✓	กลุ่มงานห้องสมุดและ พิพิธภัณฑ์ห้องสมุด
8.	ห้องสำนักงาน	โต๊ะทำงาน	475	475	465	471.67	✓		
9.	ห้องสำนักงาน	โต๊ะทำงาน	419	429	427	425	✓		กลุ่มงานติดตามและ ประเมินผลงานวุฒิสภา
10.	ห้องสำนักงาน	โต๊ะทำงาน	333	338	335	335.33		✓	
11.	ห้องสำนักงาน	โต๊ะทำงาน	376	377	376	376.33		✓	
12.	ห้องสำนักงาน	โต๊ะทำงาน	426	419	423	422.67	✓		กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล
13.	ห้องสำนักงาน	โต๊ะทำงาน	333	327	330	330		✓	
14.	ห้องสำนักงาน	โต๊ะทำงาน	211	193	195	199.67		✓	
15.	ห้องสำนักงาน	โต๊ะทำงาน	365	351	367	361		✓	กลุ่มงานติดตามและ ประเมินผลงานวุฒิสภา
16.	ห้องสำนักงาน	โต๊ะทำงาน	464	463	461	462.67	✓		
17.	ห้องสำนักงาน	โต๊ะทำงาน	351	363	361	358.33		✓	
18.	ห้องสำนักงาน	โต๊ะทำงาน	255	252	256	254.33		✓	กลุ่มงานติดตามและ ประเมินผลงานวุฒิสภา
19.	ห้องสำนักงาน	โต๊ะทำงาน	295	290	315	300		✓	
20.	ห้องสำนักงาน	โต๊ะทำงาน	310	314	314	312.67		✓	
21.	ห้องสำนักงาน	โต๊ะทำงาน	256	257	255	256		✓	

ผู้จัดบันทึก (นายนิมิตราชิต มามะ) (นายวิทยา กนอมเวช) ผู้ตรวจสอบ (นายสงกรานต์ แก้วมะเจิง)
..... ผู้ตรวจวัด ผู้จัดบันทึก ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานอาคารสถานที่

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข

หมายเหตุ : - ห้องสำนักงาน ห้องฝึกอบรม ห้องบรรยายห้องสืบค้นหนังสือ/เอกสารห้องถ่ายเอกสารห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุมบริเวณโต๊ะประชาสัมพันธ์หรือติดต่อกู้คำ โรงอาหาร ห้องปรุงอาหาร ห้องตรวจรักษา ค่าเฉลี่ยความเข้มแสง ๔๐๐ ลักซ์

- โรงพิมพ์ ห้องแท่งพิมพ์ บริเวณกระบวนการผลิต ห้องเครื่องจักร ห้องรีดกระดาษ โรงเตรียมวัสดุพิมพ์และบริเวณกระบวนการตัดตกแต่งการทำให้เรียบ ค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่าง ๔๐๐ ลักซ์

- ห้องสุชา ห้องอาบน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องลอบบี้หรือบริเวณต้อนรับ ห้องเก็บของ ลิฟต์ ค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่าง ๑๐๐ ลักซ์

** เครื่องมือในการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง Light Meter ยี่ห้อ DIGICON รุ่น LX-75SD



แบบรายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างภายในอาคาร
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนัก วิชาการ กลุ่มงาน ชั้น 2
วัน เดือน ปี ที่ตรวจวัด 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.50 น.

ลำดับ	ประเภทพื้นที่ตรวจวัด	จุดที่ตรวจ	ผลการตรวจวัด (ลักซ์)				ผลการประเมิน		หมายเหตุ
			ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ค่าเฉลี่ย	ตามเกณฑ์	ไม่เป็นไปตามเกณฑ์	
22.	ห้องสำนักงาน	โต๊ะทำงาน	329	328	328	328.33		✓	กลุ่มงานติดตามและประเมินผลงานวุฒิสภา
23.	ห้องสำนักงาน	โต๊ะทำงาน	360	359	357	358.67		✓	
24.	ห้องสำนักงาน	โต๊ะทำงาน	336	330	331	332.33		✓	
25.	ห้องสำนักงาน	โต๊ะทำงาน	303	303	301	302.33		✓	
26.	ห้องสำนักงาน	โต๊ะทำงาน	490	492	493	491.67	✓		กลุ่มงานห้องสมุดและ
27.	ห้องสำนักงาน	โต๊ะทำงาน	521	524	530	525	✓		พิพิธภัณฑ์ห้องสมุด
28.	ห้องสำนักงาน	โต๊ะทำงาน	529	532	528	529.67	✓		กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล
29.	ห้องสำนักงาน	โต๊ะทำงาน	527	511	536	524.67	✓		
30.	ห้องสำนักงาน	โต๊ะทำงาน	477	476	465	472.67	✓		
31.	ห้องสำนักงาน	โต๊ะทำงาน	418	428	429	425	✓		
32.	ห้องสำนักงาน	โต๊ะทำงาน	560	540	552	550.67	✓		
33.	ห้องสำนักงาน	โต๊ะทำงาน	520	524	517	520.33	✓		
34.	ห้องสำนักงาน	โต๊ะทำงาน	498	503	501	500.67	✓		
35.	ห้องสำนักงาน	โต๊ะทำงาน	474	514	513	500.33	✓		
36.	ห้องสำนักงาน	โต๊ะทำงาน	488	493	495	492	✓		
37.	ห้องสำนักงาน	โต๊ะทำงาน	565	557	562	561.33	✓		
38.	ห้องประชุมภายในสำนักฯ	โต๊ะ จุดที่ 1	504	498	495	499	✓		
39.		โต๊ะ จุดที่ 2	513	512	512	512.33	✓		
40.		โต๊ะ จุดที่ 2	445	446	448	446.33	✓		
41.	ห้องสำนักงาน	โต๊ะทำงาน	328	326	327	327		✓	ลบ.กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล
42.	ห้องสำนักงาน	โต๊ะทำงาน	325	400	401	375.33		✓	ลบ.กลุ่มงานติดตามฯ

ผู้จัดบันทึก (นายนิมิตราชาติ มามะ) (นายวิทยา หนองเมฆ) ผู้ตรวจสอบ (นายสงกรานต์ แก้วมะเรียง)
ผู้ตรวจวัด ผู้จัดบันทึก ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานอาคารสถานที่

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข

หมายเหตุ : - ห้องสำนักงาน ห้องฝึกอบรม ห้องบรรยายห้องสืบค้นหนังสือ/เอกสารห้องถ่ายเอกสารห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุมบริเวณใต้สะพานสัมพันธหรือติดต่อนักค้า โรงอาหาร ห้องปรุงอาหาร ห้องตรวจรักษา ค่าเฉลี่ยความเข้มแสง ๔๐๐ ลักซ์

- โรงพิมพ์ ห้องแห่งพิมพ์ บริเวณกระบวนการผลิต ห้องเครื่องจักร ห้องรัดกระดาษ โรงเตรียมวัสดุพิมพ์และบริเวณกระบวนการตัดตกแต่งการทำให้เรียบ ค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่าง ๔๐๐ ลักซ์

- ห้องสุขา ห้องอาบน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องลอบบี้หรือบริเวณต้อนรับ ห้องเก็บของ ลิฟต์ ค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่าง ๑๐๐ ลักซ์

** เครื่องมือในการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง Light Meter ยี่ห้อ DIGICON รุ่น LX-75SD



แผ่นที่ 3

แบบรายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างภายในอาคาร
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนัก วิชาการ กลุ่มงาน ชั้น 2

วัน เดือน ปี ที่ตรวจวัด 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.50 น.

ลำดับ	ประเภทพื้นที่ตรวจวัด	จุดที่ตรวจ	ผลการตรวจวัด (ลักซ์)				ผลการประเมิน		หมายเหตุ
			ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ค่าเฉลี่ย	ตามเกณฑ์	ไม่เป็นไปตามเกณฑ์	
43.	ห้องสำนักงาน	โต๊ะทำงาน	331	328	326	328.33		✓	ผบ.กลุ่มงานบริหารทั่วไป


ผู้จัดบันทึก (.....) (.....) ผู้ตรวจสอบ (.....)
 นายนิมิตรา สิด งามมะ นายวิทยา งามอมระ นายสงกรานต์ แก้วมะเร็ง
 ผู้ตรวจวัด ผู้จัดบันทึก ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานอาคารสถานที่

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข

หมายเหตุ : - ห้องสำนักงาน ห้องฝึกอบรม ห้องบรรยายห้องสืบค้นหนังสือ/เอกสารห้องถ่ายเอกสารห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุมบริเวณใต้
 ประชาสัมพันธ์หรือติดต่อกุ๊กค้า โรงอาหาร ห้องปรุงอาหาร ห้องตรวจรักษา ค่าเฉลี่ยความเข้มแสง ๔๐๐ ลักซ์
 - โรงพิมพ์ ห้องแห่งพิมพ์ บริเวณกระบวนการผลิต ห้องเครื่องจักร ห้องรัดกระดาษ โรงเตรียมวัสดุพิมพ์และบริเวณกระบวนการตัดตกแต่งการ
 ทำให้เรียบ ค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่าง ๔๐๐ ลักซ์
 - ห้องสุขา ห้องอาบน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องลอบบี้หรือบริเวณต้อนรับ ห้องเก็บของ ลิฟต์ ค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่าง ๑๐๐ ลักซ์
 ** เครื่องมือในการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง Light Meter ยี่ห้อ DIGICON รุ่น LX-75SD



สำนักงานและวิทยาการสุขภาพ
สำนักบริหารงานกลาง
กรุงเทพมหานคร

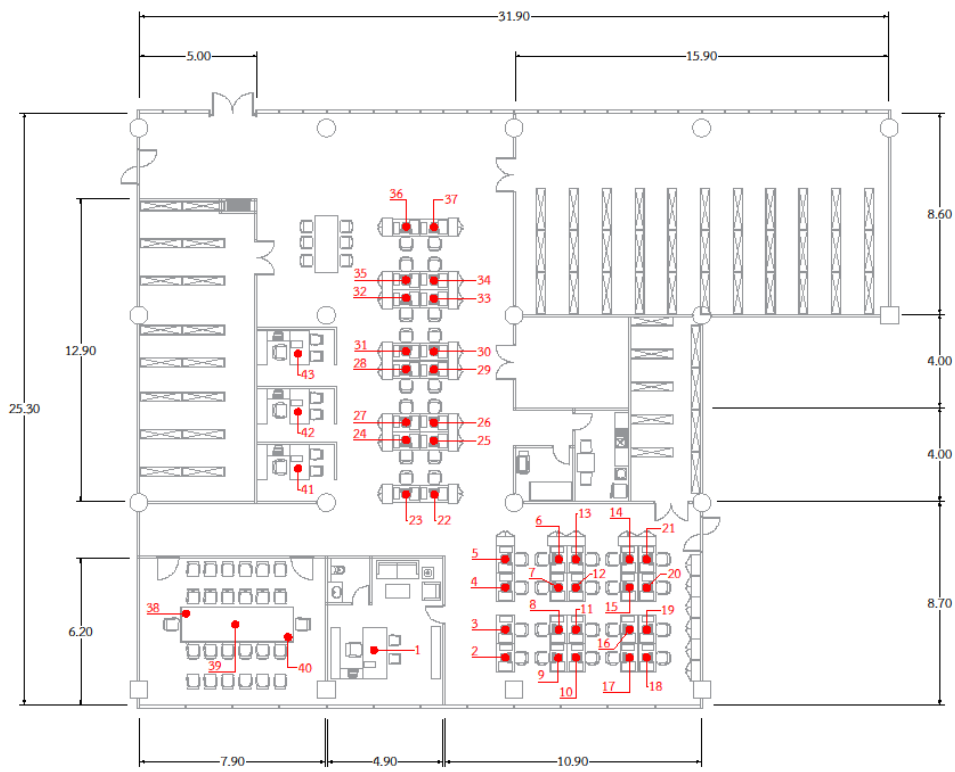

สำนักวิชาการ
จุดตรวจวัดความเข้มแสงในการทำงาน

2th FLOOR PLAN

1 : 3500
